

# Checklist maatvoering dakopstanden




|                                       |                                                      |                  |                      |                   |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------|-------------------|
| Projectnaam:<br>BE - 1 - Residentieel |                                                      | Projectnr.:<br>1 |                      |                   |
| Oplossing:<br>HVC 100200 SL0071       |                                                      | Tekening nummer: |                      |                   |
| Contactpersoon:<br>VELUX Belgium      | Telefoon:<br>+32 10 42 09 09/<br>Telefax 10 41 68 02 | E-mail:          | Datum:<br>29/10/2018 | Herzieningsdatum: |



| Specificatie             |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Type lichtstraat         | Lessenaarsdak in 5° |
| Aantal gelijke sparingen | 1                   |


**WAARSCHUWING** - de maatname van de opstand dient altijd gebaseerd te zijn op de afgewerkte, definitieve uitwendige maatvoering incl. dakbedekking.

# Checklist maatvoering dakopstanden

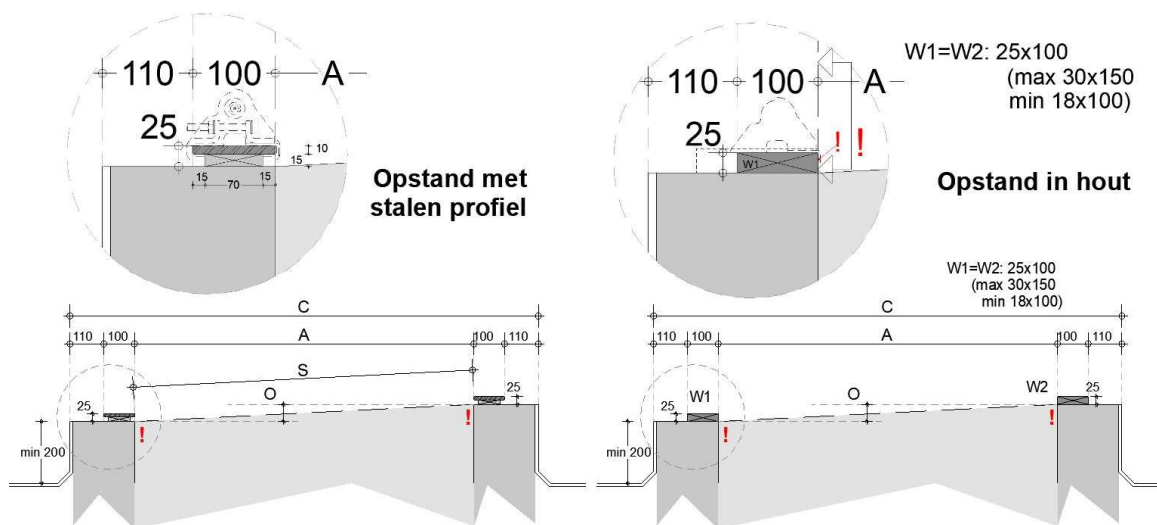

| Maatvoering voor dwarsdoorsnede A-A [mm]                                                                                    | Gemaatvoerd [mm] | Gemeten [mm] | Opmerking |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| A: Breedte sparing                                                                                                          | 2102             |              |           |
| C: Breedte opstand                                                                                                          | 2522             |              |           |
| Breedte boven-en onderwand opstand - Van binnenzijde van het staalprofiel tot de afgewerkte buitenzijde, speling $\pm 5$ mm | 210              |              |           |
| O: Hoogteverschil opstand, speling $+5/-0$ mm                                                                               | 143              |              |           |
| Hoogte opstand boven afgewerkte dak                                                                                         | min. 200         |              |           |
| S: Afstand tussen staalprofielen/binnenmaat tussen staalprofielen, speling $\pm 5$ mm                                       | 2107             |              |           |

# Checklist maatvoering dakopstanden



| Maatvoering voor langdoorsnede B-B [mm]                                             | Gemaatvoerd [mm] | Gemeten [mm] | Opmerking |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| B: Lengte sparing                                                                   | 3056             |              |           |
| D: Lengte opstand - Speling $\pm 5$ mm                                              | 3476             |              |           |
| Gekruiste meting - Opstand (voorkant/zijkant) mag max. 5 mm afwijken van $90^\circ$ | -                |              |           |
| Breedte zijwanden opstand                                                           | 210              |              |           |
| Hoogte opstand boven afgewerkte dak                                                 | min. 200         |              |           |

# Checklist maatvoering dakopstanden

Staalprofielen (niet door VELUX België geleverd)

|                                                                                                                                                    | Gemaatvoerd [mm] | Gemeten [mm] | Opmerking |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------|
| Minimale lengte - Gecentreerd op de lengte opstand                                                                                                 | 3056             |              |           |
|                                                                                                                                                    | Controle punten  | Opmerking    |           |
| Staalprofielen gemonteerd?                                                                                                                         |                  |              |           |
| Afmeting flens staalprofiel (100 mm x 8-11 mm).                                                                                                    |                  |              |           |
| Vlakheid, verticale, max. 2 mm op een 2 m rechte rand                                                                                              |                  |              |           |
| Vlakheid, horizontale, max. 2 mm op een 2 m rechte rand                                                                                            |                  |              |           |
| Ruimte voor klemmen onder het staalprofiel (15 x 15 mm).                                                                                           |                  |              |           |
| <b>Dampremmende laag/dampdichte folie</b><br><br>Is de dampremmende laag/dampdichte folie op de dakopstand gereed om aan de modules vast te maken? |                  |              |           |

## Elektriciteit - Locatie aansluitingdoos

Zit de aansluitingsdoos in de weg van de sparing? (Lengte, dikte en uitvoering van de bedrading kan niet voor de toepassing worden gegarandeerd)

| Opmerking |
|-----------|
|           |
