


# Checklist maatvoering dakopstanden




<b>Projectnaam:</b> BE - 1 - Residentieel		<b>Projectnr.:</b> 1		
<b>Oplossing:</b> HVC 100240 SL0075		<b>Tekening nummer:</b>		
<b>Contactpersoon:</b> VELUX Belgium	<b>Telefoon:</b> +32 10 42 09 09/ Telefax 10 41 68 02	<b>E-mail:</b>	<b>Datum:</b> 29/10/2018	<b>Herzieningsdatum:</b>

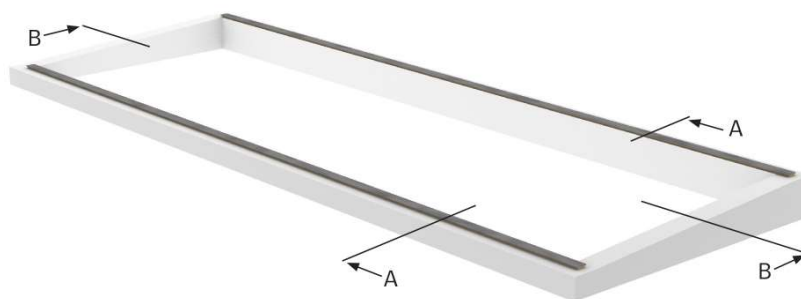

Specificatie	
Type lichtstraat	Lessenaarsdak in 5°
Aantal gelijke sparingen	1


**WAARSCHUWING** - de maatname van de opstand dient altijd gebaseerd te zijn op de afgewerkte, definitieve uitwendige maatvoering incl. dakbedekking.

# Checklist maatvoering dakopstanden

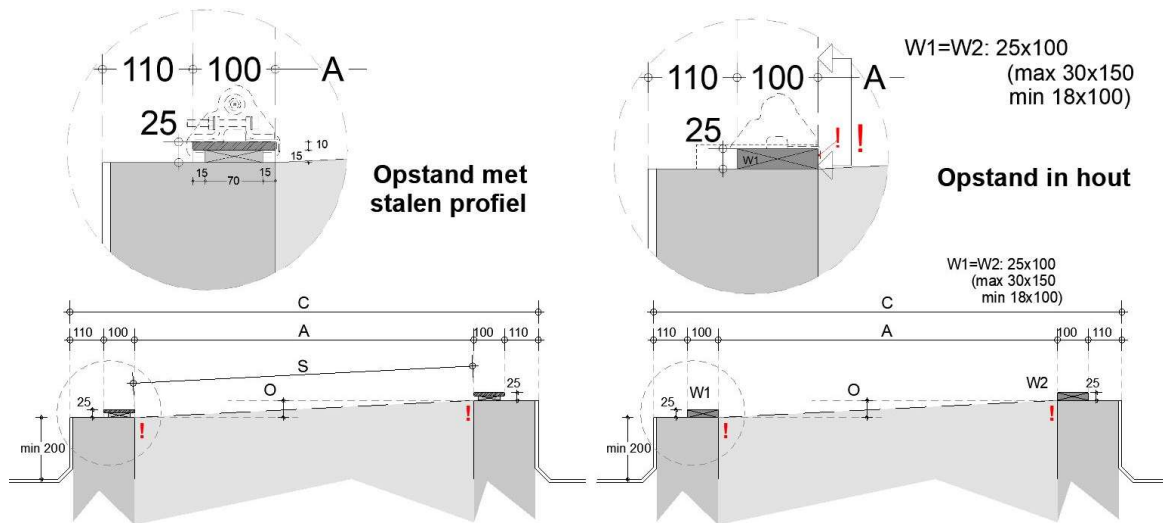

Maatvoering voor dwarsdoorsnede A-A [mm]	Gemaatvoerd [mm]	Gemeten [mm]	Opmerking
A: Breedte sparing	2500		
C: Breedte opstand	2920		
Breedte boven-en onderwand opstand - Van binnenzijde van het staalprofiel tot de afgewerkte buitenzijde, speling $\pm 5$ mm	210		
O: Hoogteverschil opstand, speling $+5/-0$ mm	178		
Hoogte opstand boven afgewerkte dak	min. 200		
S: Afstand tussen staalprofielen/binnenmaat tussen staalprofielen, speling $\pm 5$ mm	2506		

# Checklist maatvoering dakopstanden



Maatvoering voor langdoorsnede B-B [mm]	Gemaatvoerd [mm]	Gemeten [mm]	Opmerking
B: Lengte sparing	5056		
D: Lengte opstand - Speling $\pm 5$ mm	5476		
Gekruiste meting - Opstand (voorkant/zijkant) mag max. 5 mm afwijken van $90^\circ$	-		
Breedte zijwanden opstand	210		
Hoogte opstand boven afgewerkte dak	min. 200		

# Checklist maatvoering dakopstanden

Staalprofielen (niet door VELUX België geleverd)

	Gemaatvoerd [mm]	Gemeten [mm]	Opmerking
Minimale lengte - Gecentreerd op de lengte opstand	5056		
	Controle punten	Opmerking	
Staalprofielen gemonteerd?			
Afmeting flens staalprofiel (100 mm x 8-11 mm).			
Vlakheid, verticale, max. 2 mm op een 2 m rechte rand			
Vlakheid, horizontale, max. 2 mm op een 2 m rechte rand			
Ruimte voor klemmen onder het staalprofiel (15 x 15 mm).			
<b>Dampremmende laag/dampdichte folie</b>  Is de dampremmende laag/dampdichte folie op de dakopstand gereed om aan de modules vast te maken?			

## Elektriciteit - Locatie aansluitingdoos

Zit de aansluitingsdoos in de weg van de sparing? (Lengte, dikte en uitvoering van de bedrading kan niet voor de toepassing worden gegarandeerd)

Opmerking
