


Projekt navn:	Projekt nr. :	Side:
Installations nr. (position, placering, hul nr. ect.):		

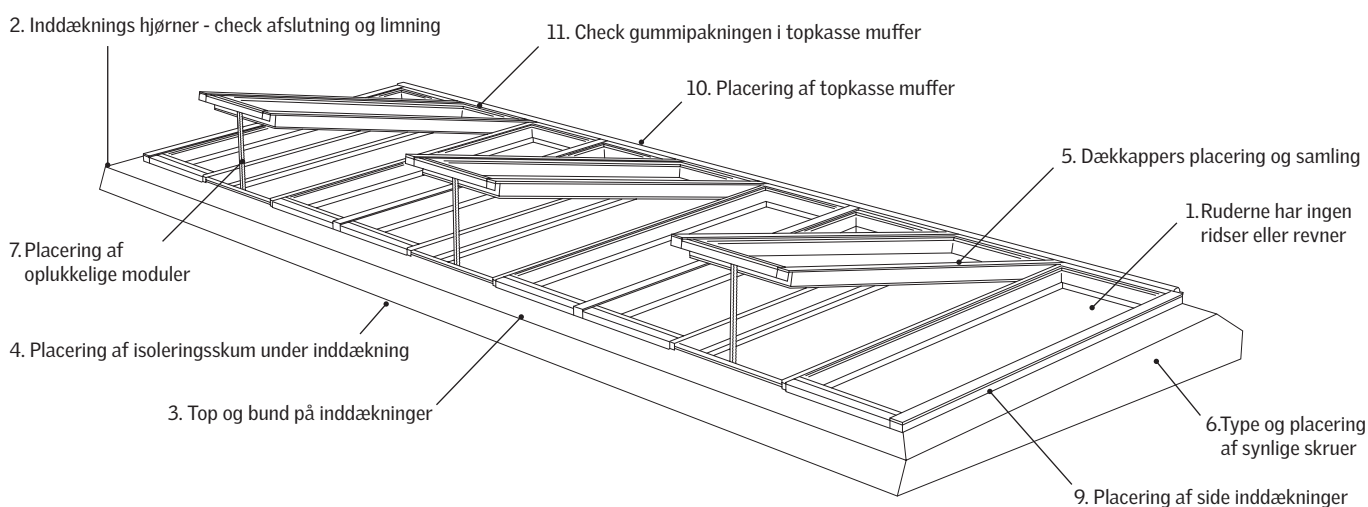

Del:			
Nr.	Check punkt	Check andel	Metode
1.	Ruderne har ingen ridser eller revner	100 %	Visuelt check
2.	Inddæknings hjørner - check afslutning og limning	100 %	Visuelt check
3.	Top og bund på inddækninger	100 %	Visuelt check
4.	Placering af isoleringsskum under inddækning	100 %	Manuel
5.	Dækkappers placering og samling	100 %	Visuelt check
6.	Type og placering af synlige skruer	100 %	Visuelt check
7.	Placering af oplukkelige moduler	100 %	Visuelt check
8.	Funktion af styresystemet	100 %	Fysisk afprøvning
9.	Placering af side inddækninger	100 %	Visuelt check
10.	Placering af topkasse muffer	100 %	Manuel
11.	Check gummipakningen i topkasse muffer	100 %	Visuelt check
12.	Indvendigt check fugen mellem lysning og karm	100 %	Visuelt check

Dato:	Udført af:
-------	------------

Installations check - del 1



Projekt navn:	Projekt nr. :	Side:
		Installations nr. (position, placering, hul nr. ect.):

Dato	Check punkt												Bemærkninger	Init.	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

Dato:	Udført af:
-------	------------
